

Asignatura: Ingeniería y calidad de software

Curso: 4k4 - 2026

Trabajo práctico N° 7

SCRUM-Dinámica de Scrum

CURSO: 4k4

GRUPO 1:

Avram, Leandro - 69099

Bobroviec, Ivan - 95909

Britos, Sofia Ailen - 90121

Cavilla, Matias - 90589

Costanzo, Franco - 89478

De Goycochea, Mateo - 85203

Höhlke, Augusto - 90263

Romero, Victoria - 89909

Romero Justo, Milton Jesus - 68396

Sosa, Diego - 82397

1. Configuración del Equipo y Sprints

La dinámica se ejecutó en 3 Sprints consecutivos de 15 minutos cada uno. Cada Sprint incluyó las siguientes ceremonias:

- Sprint Planning: ~30 segundos a 1 minuto al comienzo de cada Sprint.
- Daily Scrum: cada 5 minutos durante la ejecución del Sprint.
- Sprint Review y Sprint Retrospective: al finalizar cada Sprint.

2. Sprint 1

2.1. Sprint planning

En el Sprint 1 no se asignaron Story Points a las User Stories, por lo que no se generó Burndown Chart ni velocidad de equipo para esta iteración.

El equipo seleccionó las siguientes historias para el Sprint Backlog, priorizando por valor de negocio:

Atracción	Personas Asignadas	Estado al final del Sprint
Pista de Autos Chocadores (US2)	2	Terminada
Dos Hamacas (US5)	2	Terminada
Rueda de la Fortuna (US1)	2	Comenzada (no terminada)
Calesita (US6)	1	Comenzada (no terminada)

2.2. Ejecución y daily scrums

Se realizaron Daily Scrums cada 5 minutos. En la tercera y última Daily Scrum del Sprint 1 se confirmó la finalización de la Pista de Autos Chocadores y las Dos Hamacas.

La Rueda de la Fortuna y la Calesita quedaron con trabajo iniciado, y su construcción continuó en el Sprint 2 como ítems arrastrados del backlog.

2.3. Objetivo del sprint

Terminar la pista de autos y hamacas ya que son tareas sencillas y comenzar con las tareas que más valor aportan al negocio que son la rueda de la fortuna y la calesita.

2.4. Sprint review

Atracciones entregadas y aceptadas al final del Sprint 1:

- Pista de Autos Chocadores — **ACEPTADA.**
- Dos Hamacas — **ACEPTADA.**

Atracciones con trabajo en curso (no aceptadas, continúan en Sprint 2):

- Rueda de la Fortuna — **trabajo iniciado.**
- Calesita — **trabajo iniciado.**

3. Sprint 2

3.1. Sprint planning

A partir del Sprint 2 se incorporó la estimación mediante Story Points. Los ítems arrastrados del Sprint 1 recibieron SP residuales, descontando el esfuerzo ya realizado.


Atracción	SP Totales	SP Sprint 1	SP Restantes (SP Sprint 2)	Personas	Estado al finalizar Sprint 2
Montaña Rusa (US4)	8	0	8	2	No terminada
Calesita (US6)	5	2	3	2	Terminada (1ra Daily)
Rueda de la Fortuna (US1)	8	3	5	1	Terminada (2da Daily)
Casa del Terror (US3)	5	0	5	2	Terminada (3ra Daily)

3.2. Ejecución y Daily Scrums

Se realizaron 3 Daily Scrums a intervalos de 5 minutos. El avance fue el siguiente:

- 1ra Daily: Se terminó la Calesita (3 SP completados en esta daily).
- 2da Daily: Se terminó la Rueda de la Fortuna (5 SP completados en las 2 primeras dailies).
- 3ra Daily: Se terminó la Casa del Terror (5 SP completados). La Montaña Rusa quedó sin terminar.

Tiempo (Eje X)	Story Points Restantes (Eje Y)	Tarea Terminada
Inicio (0 min)	21	-
1ra Daily (5 min)	18	Calesita
2da Daily (10 min)	13	Rueda de la Fortuna
3ra Daily/Fin (15 min)	8	Casa del Terror

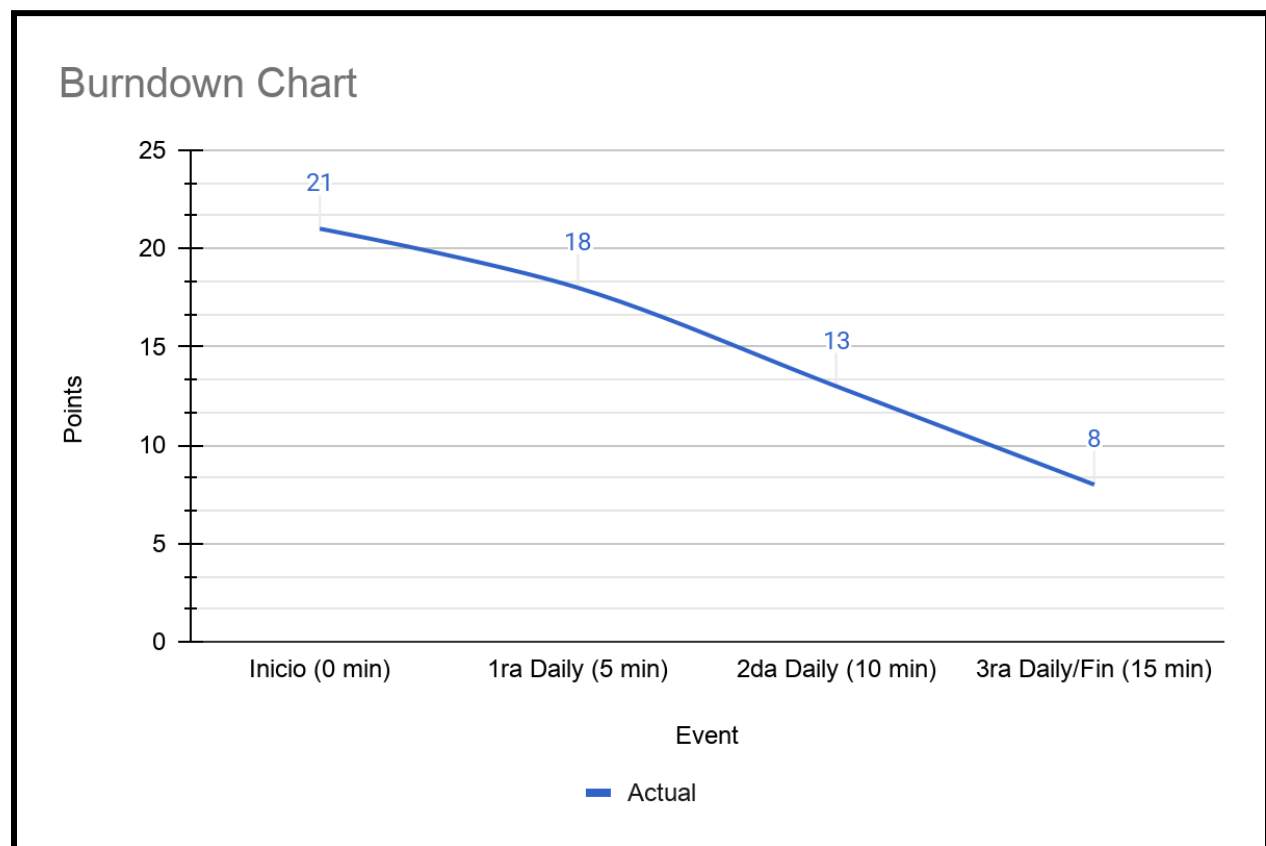

3.3. Objetivo del sprint

Completar las atracciones iniciadas en el Sprint 1 e incorporar nuevas atracciones de alto valor de negocio: Montaña Rusa y Casa del Terror.

Nota: Al finalizar el Sprint 2 quedaron 8 SP sin completar correspondientes a la Montaña Rusa, que continuó en el Sprint 3.

Asignatura: Ingeniería y calidad de software

Curso: 4k4 - 2026

3.4. Sprint review

Atracciones entregadas y aceptadas al final del Sprint 2:

- Calesita — **ACEPTADA.**
- Rueda de la Fortuna — **ACEPTADA.**
- Casa del Terror — **ACEPTADA.**

Ítems no completados:

Montaña Rusa — **trabajo iniciado.**

3. Sprint 3

3.1. Sprint planning

En el Sprint 3 se incorporaron nuevos requerimientos solicitados por el Product Owner durante la Sprint Review del Sprint 2: decoración general del parque y adición de un corazón verde en la Calesita.


Ítem	SP Totales	SP Sprint 2	SP Restantes (SP Sprint 3)	Personas	Estado
Montaña Rusa (US4)	8	5	3	2	Completada
Calesita - corazón verde (US6 extra)	1	0	1	1	Completada
Decoración del Parque (nuevo)	2	0	2	4	Completada

3.2. Ejecución y Daily Scrums

El Sprint 3 inició con 6 SP totales. Los 4 integrantes disponibles se focalizaron prioritariamente en la decoración del parque y en finalizar la Montaña Rusa en paralelo.

Tiempo (Eje X)	Story Points Restantes (Eje Y)	Tarea Terminada
Inicio (0 min)	6	-

Tiempo (Eje X)	Story Points Restantes (Eje Y)	Tarea Terminada
1ra Daily (5 min)	5	Calesita
2da Daily (10 min)	2	Montaña rusa
3ra Daily/Fin (15 min)	0	Decoración

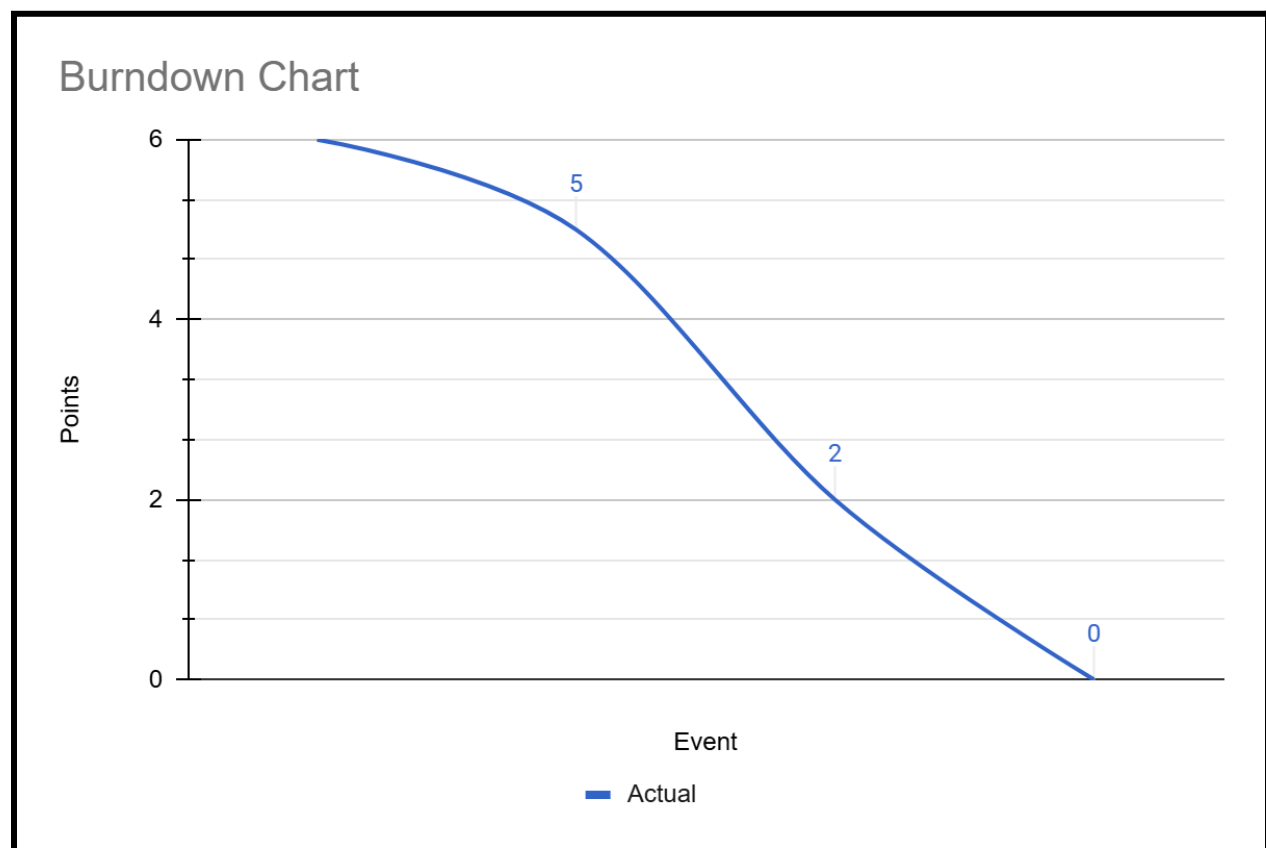

3.3. Objetivo del sprint

Finalizar la Montaña Rusa, incorporar el requerimiento adicional sobre la Calesita y completar la decoración general del parque.

3.4. Sprint review

Todos los ítems del Sprint 3 fueron completados y aceptados:



- Montaña Rusa — **ACEPTADA.**
- Calesita con corazón verde (requerimiento adicional) — **ACEPTADA.**

Asignatura: Ingeniería y calidad de software

Curso: 4k4 - 2026

- Decoración del Parque — **ACEPTADA.**

4. Fotos adjuntadas

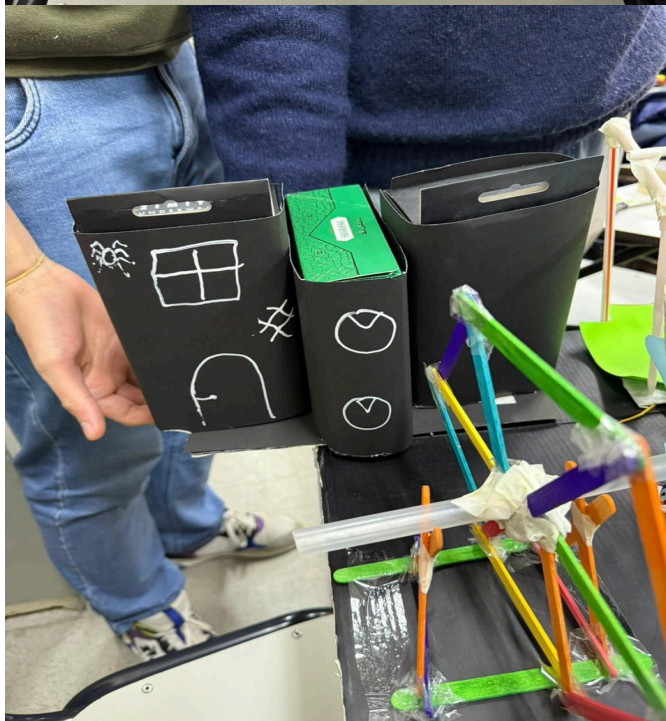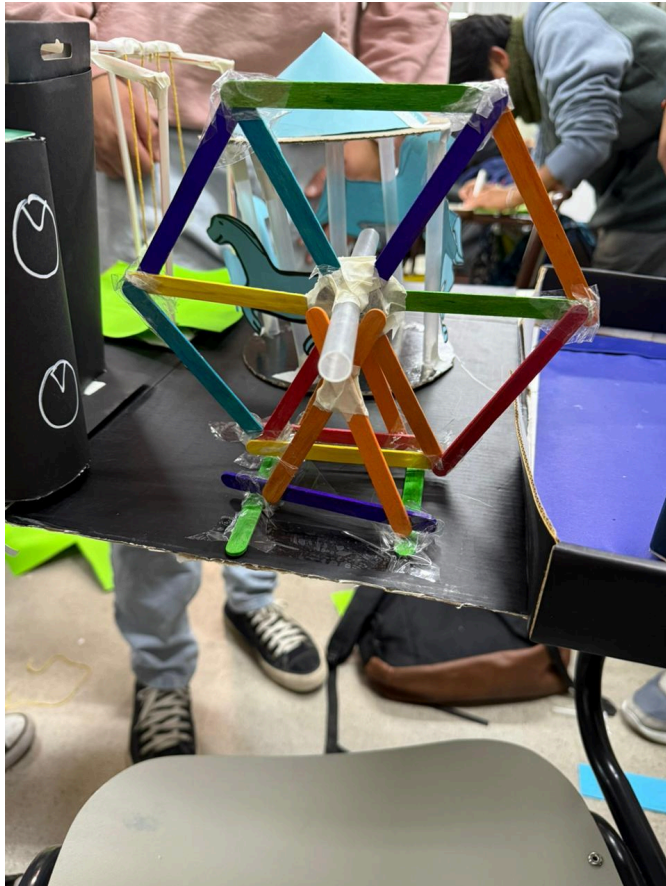

Asignatura: Ingeniería y calidad de software

Curso: 4k4 - 2026



5. Retrospectiva

La dinámica permitió experimentar de manera tangible el flujo de trabajo del framework Scrum. La construcción física de las atracciones hizo que los conceptos de Incremento de Producto, Definición de Done, Sprint Backlog y velocidad resultan intuitivos y fáciles de internalizar.

Podríamos haber destinado más recursos para poder finalizar las tareas más importantes en el primer sprint pero decidimos trabajar más segmentado para poder cumplir con las tareas en el plazo de los 3 sprints.

La incorporación progresiva de Story Points a partir del Sprint 2 demostró cómo la estimación relativa ayuda al equipo a comprometer trabajo de manera más realista y a generar transparencia sobre el avance mediante el Burndown Chart.

Finalmente, la gestión de requerimientos adicionales en el Sprint 3 (corazón verde en la calesita y decoración del parque) ilustró cómo Scrum permite incorporar cambios de manera controlada al inicio de cada iteración, manteniendo la flexibilidad sin afectar la estabilidad del Sprint en curso.
